



Kantonalna uprava civilne zaštite

Broj:18/03.2-44-10/09
Tuzla, 07.01.2009. godine

Informacija o ostvarenim rezultatima na deminiranju i trajnom obilježavanju minskih polja na području Tuzlanskog kantona u 2008. godini

U V O D

Kantonalna uprava civilne zaštite je, kao i ranije, imala jednu od vodećih uloga u koordiniranju i praćenju realizacija zadataka na polju neutralisanja neeksplozivnih i minskoeksplozivnih ubojitih sredstava, kao i operacija manuelnog čišćenja, tehničkog izviđanja i obilježavanja rizičnih površina na području Tuzlanskog kantona. Svi gore navedeni poslovi i zadaci realizirani se preko Kantonalnog tima civilne zaštite za deminiranje i uklanjanje neeksplozivnih ubojitih sredstava i timova Oružanih snaga BiH kao i drugih domaćih i stranih kompanija-organizacija.

Kao polaznu osnovu za realizaciju zadataka iz oblasti deminiranja i uklanjanja neeksplozivnih ubojitih sredstava činila je Kantonalna lista prioriteta za deminiranje i trajno obilježavanje na području Tuzlanskog kantona koja je urađena na osnovu prijedloga iz općina i ulaznih parametara dobivenih od Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini (BHMACH), a koja je usvojena na Vladi TK i ovjerena od strane Premijera kantona.

Listom je planirano da tokom 2008. godine budu deminirane slijedeće površine:

- čišćenje	368.235,43 m ²
- tehničko izviđanje I kategorije	1.097.869,90 m ²
- tehničko izviđanje II kategorije	455.878,05 m ²
.....	
U K U P N O :	1.921.983,38 m²

Vrlo povoljni vremenski uvjeti omogućili su da se dosta rano započne sa izvođenjem deminerskih radova. Međutim, kao i prošle godine, i ove su samo timovi Civilne zaštite i OS BiH odmah startali, a do značajnijeg uključivanja drugih deminerskih organizacija i kompanija dolazi tek u zadnjoj dekadi 2008. godine.

I DEMINIRANJE NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA


Sukladno Kantonallnoj listi prioriteta za deminiranje u toku 2008. godine na poslovima deminiranja, pored tima civilne zaštite, bile su angažirane i druge organizacije i kompanije kao što su deminerski timovi OS BiH, UG Demira, BH Demining, Provita, USB Balkans, Stopmines te druge domaće i strane kompanije.

Generalno se može reći da je isunjenje planskih površina potpuno izostalo i da deminirana površina ispod 50% opominje i obavezuje cjelokupnu zajednicu na bržem rješavanju problema koji su osnovna prepreka za priliv većih donatorskih sredstava. O potrebi izdvajanja domaćih sredstava za poslove deminiranja nije potrebno posebno elaborirati.

DEMINIRANJE NA TUZLANSKOM KANTONU ZA PERIOD 01. 01. – 31.12. 2008. GODINE

R br.	ID DEM	LOKACIJA – naziv projekta	OPĆINA	PM AKCIJA	K at	POVRŠINA m ²	Izvođač	Početak radova	Završeta Radova
1.	22251	Cviljevina – Požarnica	Tuzla	T I	1	66.458,00	BH Demining	21.01.08	11.02.08
2.	12280	Dukanovina-obrad.povr“A”.	Lukavac	čišćenje	1	5.546,00	BH Demining	29.01.08.	22.02.08.
3.	12281	MZ Orahovica-Dukanovina mezarje	Lukavac	čišćenje	1	1.983,00	BH Demining	29.01.08.	19.02.08.
4.	12904	Obala i korito rijeke Spreče 4	Gračanica	T I	1	13.524,71	KUCZ	11.02.08	10.04.08.
5.	12230	DV 10 KV Jelovo brdo Gojčin	Kalesija	T I	1	7.667,18	VILACOL	14.02.08.	14.03.08.
6.	12994	Potkućina	Sapna	čišćenje	1	1.631,96	BH Demining	20.02.08.	28.02.08.
7.	12237	NN mreža “Gojčin 2”	Kalesija	T I	1	5.364,00	VILACOL	21.02.08.	25.03.08.
8.	12302	Gornje Dubrave	Živinice	čišćenje	1	8.305,00	KUCZ	17.03.08.	11.06.08.
9.	12074	Turija Selo mira 3.	Lukavac	čišćenje	1	57.242,97	OS BiH	17.03.08.	18.04. 08.
10.	11938	Avramovina 3/1	Gradačac	čišćenje	1	28.611,00	NPA	21.04.08.	Prenos
11.	12316	Sižje Šuma Česte	Lukavac	čišćenje	1	18.992,00	OS BiH	05.05.08.	15.08.08.
12.	12337	Buče Visori 2.	Čelić	čišćenje	1	9.078,00	KUCZ	19.05.08.	19.08.08.
13.	12451	Orahovica 2. potok 10 KV	Lukavac	čišćenje	1	1.389,00	Mine eksploziv	29.07.08.	22.08.08.
14.	12447	Seona	Banovići	T I	1	95.592,00	DEMIRA	29.07.08.	12.08.08.
15.	12431	Požarike Begovina	Gradačac	T I	1	42.257,03	OS BiH	11.08.08	17.11.08.
16.	12427	Ledenice Donje 1A	Gradačac	T I	1	10.040,48	OS BiH	11.08.08	5.09.08.
17.	12470	Međunarodni aerodrome Tuzla 1.	Živinice	T I	1	19.693,48	OS BiH	11.08.08	3.11.08.
18.	12465	Od Markovića do Careve kuće	Kalesija	T I	1	101.526,00 95.000,00	KUCZ	19.08.08.	Prenos!!
19.	12444	Mramor MZ Seona	Banovići	T I	1	9.210,65	DEMIRA	04.08.08.	18.08.08.
20.	12446	Palučak na ušću Turije Seona	Banovići	T I	1	65.928,28	DEMIRA	04.08.08.	12.08.08.
21.	12486	Sibovac Kota 136.	Gradačac	T I	1	28.711,25	OS BiH	08.09.08.	18.11.08.
22.	12487	Donja Lohinja	Gračanica	čišćenje	1	12.082,52	PROVITA	10.09.08.	29.10.08.
23.	12510	Prahulje-Ratkovići	Čelić	čišćenje	1	220,15	KUCZ	06.10.08	15.10.08.
24.	12498	D.Skipovac – šuma Guste	Gračanica	čišćenje	1	8.170,75	STOPMINES	06.10.08.	29.10.08.
25.	12523	Ban Brdo-Čifluk	Kalesija	čišćenje	1	7.215,02	UXB	15.10.08.	26.11.08.
26.	12525	Ban Brdo 1.	Kalesija	čišćenje	1	7.697,88	UXB	15.10.08.	26.11.08.
27.	12521	Mehmedovići-Hemlijaši 2 Memići	Kalesija	čišćenje	1	26.363,16	UXB	23.10.08.	12.12.08.
28.	12478	Ledenice Donje 2	Gradačac	T I	1	14.301,73	OS BiH	23.10.08.	24.12.08.
29.	12531	Kolimer	Tuzla	čišćenje	1	32.165,98	Pazi mine Vitez	03.11.08.	16.12.08.
30.	12524	Toromanovići Banj brdo put	Kalesija	čišćenje	1	8.105,88	UXB	03.11.08.	26.11.08.
31.	12522	Mehmedovići MZ Memići	Kalesija	čišćenje	1	15.358,53	UXB	03.11.08.	12.12.08.
32.	12484	Vida 2A – Lipovci	Gradačac	T I	1	40.401,56	OS BiH	17.11.08.	Prenos
33.	12534	Kazin tuk 1.	Kalesija	T I	2	162.003,21	KUCZ	18.11.08.	Prenos
34.	12562	Seljublje - Izvor Baščica	Kalesija	čišćenje	1	1.994,51	UXB	02.12.08.	12.12.08.
35.	12543	Trepala-Jelovača	Lukavac	čišćenje	1	16.287,83	STOPMINES	11.12.08.	Prenos
36.	12532	V.Brijesnica	Doboj - Istok	čišćenje	1	8.840,00	STOPMINES	01.12.08.	15.12.08.
37.	12573	Zaseok Dukanovina Lokal vodovod	Lukavac	čišćenje	1	5.515,67	STOPMINES	15.12.08.	31.12.08.

UKUPNO ZAVRŠENO	704.653,77	36,66 %
U PROCESU	253.829,60	13,21 %
OSTATAK OD PLANA	963.500,01	50,13 %
PLAN ZA 2008.GODINU	1.921.983,38	100,00 %

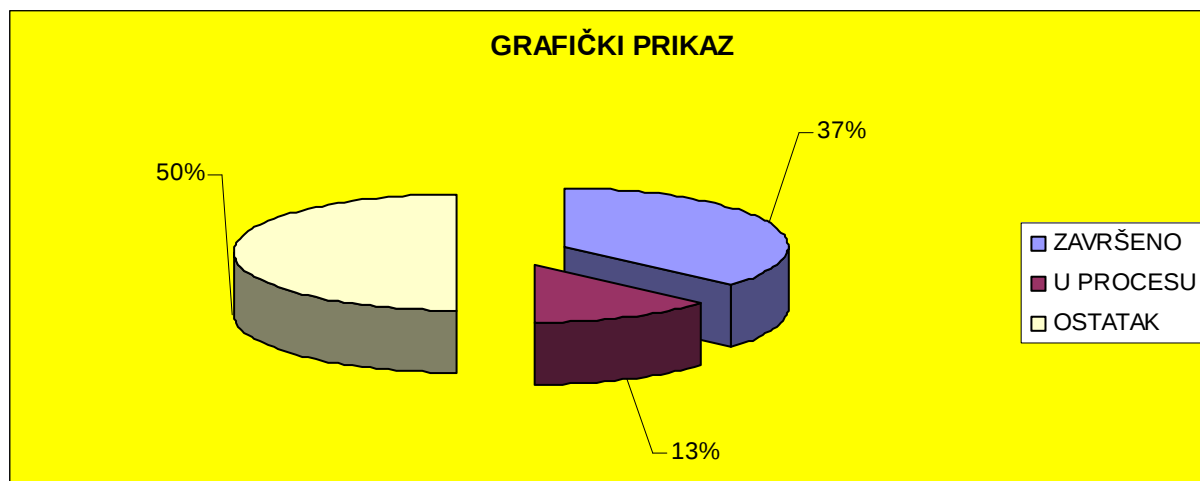


Sumirajući postignuti rezultat na polju deminiranja u toku 2008. godine možemo konstatirati da je, naspram planirane površine predviđene za deminiranje, postignut skroman rezultat.

Tokom trajanja deminerske sezone u odnosu na planiranih 1.921.983,38 m² deminirano je 704.653,77 m² ili 36,66%.

Pregled broja deminiranih zadataka i površina po izvođaču radova

IZVOĐAČ	Broj projekata	Površina	Procent
OS BiH	6	162.527,69	23,06 %
KUCZ	5	125.902,05	17,87 %
OSTALI	26	416.224,03	59,07 %
UKUPNO	37	704.653,77	100,00%

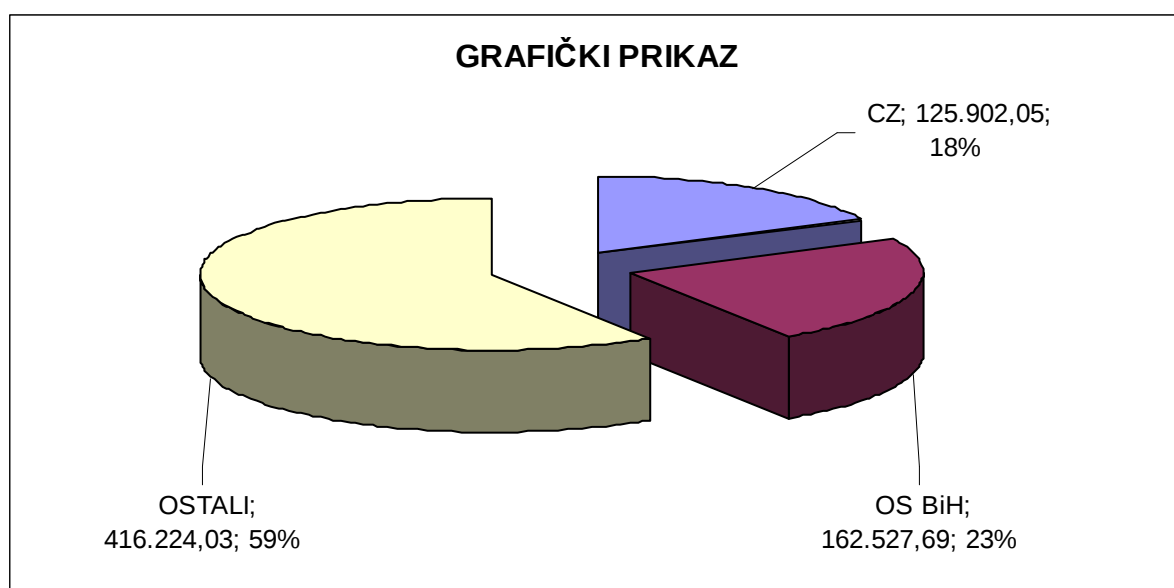


Prema podacima s kojima raspolaže KUCZ može se konstatirati da od početka izvođenja deminerskih radova na našem kantonu do sada je deminirana površina terena od 6.822.411,24 m².

Godina	Bez certifikata	1997.	1998.	1999.	2000.	2001.	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.
Površin m ²	806.231	5.000	128.546	320.438	319.332	584.141	252.828	622.823	639.009	1.149.706	565.447	724.254

2008.
704.654

SVEUKUPNO: 6.822.411,24 m²

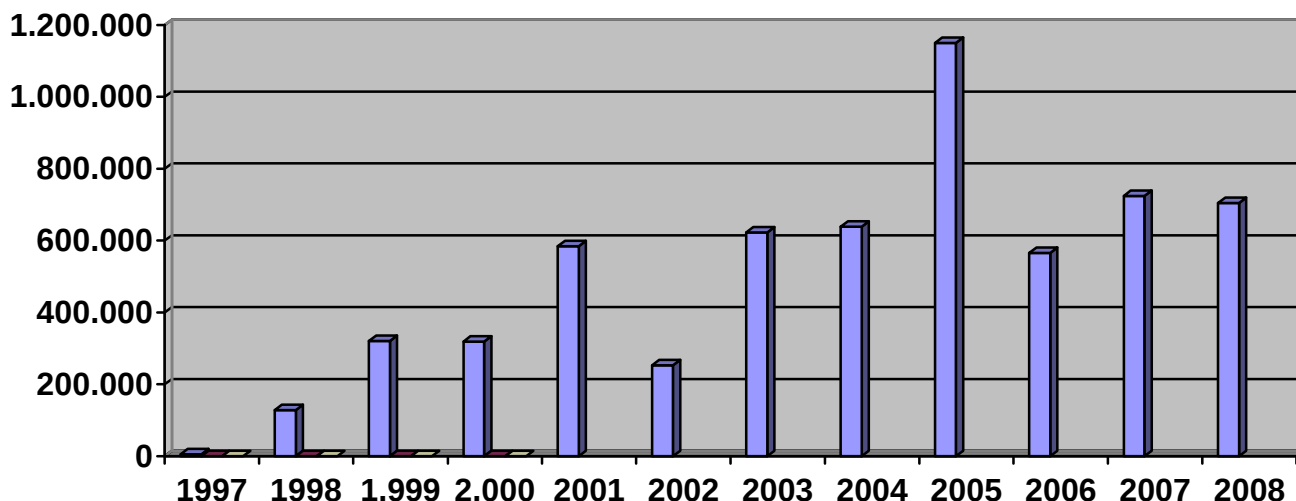

Sukladno podacima Regionalnog ureda BHMAC-a Tuzla od 30.09.2008. godine na području Tuzlanskog kantona još uvijek se kao sumnjiva površina vodi 85.633.497,00 m².

Ono što je posebno interesantno je da Tuzlanski kanton spada u prostore u kojima je sumnjava površina na kraju prošle godine bila manja u odnosu na sadašnje stanje. To samo pokazuje da još uvijek velike površine Tuzlanskog kantona nisu obrađene i tek trebaju doći na red za izviđanje i izradu projektne dokumentacije.

II OBILJEŽAVANJE MINIRANIH POVRŠINA

Izdvajanja finansijskih sredstava iz općinskih i kantonalnog proračuna za obilježavanje i ograđivanje miniranih površina nastavljen je i tokom ove godine. Naime, Kantonalna uprava civilne zaštite je iz svih proračunskih sredstava dodijelila općinama pomoć za ove namjene, a i pojedine općine su planirale određena sredstva, ali zbog objektivnih i subjektivnih okolnosti većina njih ista nisu realizirali.

Pored trajnog obilježavanja sumnjivih površina u sklopu projekata koji su bili predmet izvođenja deminerskih radova, nije bilo značajnijih poslova na obilježavanju u sklopu zasebnih projekata. Treba istaći aktivnosti u općinama Banovići, Doboj-Istok i Gračanica gdje je uz pomoć sredstava koja su dodijeljena od strane Kantonalne uprave civilne zaštite i lokalne vlasti izvršeno hitno obilježavanje na nekoliko sumnjivih lokaliteta.

Za razliku od prethodnih godina kada je realizirano nekoliko projekata trajnog obilježavanja postavljanjem ograde, prošla i ova godina predstavljaju prekretnicu u razmišljanjima kada je u pitanju ovaj vid obilježavanja, jer su iskustvo i vrijeme pokazali da se radi o vrlo skupom, a istovremeno i nezahvalnom poslu jer te ograde budu vrlo brzo predmet otuđivanja i sudskih procesa.

III ZAKLJUČAK

Na osnovu rezultata koji su ostvareni na poslovima deminiranja i trajnog obilježavanja na području Tuzlanskog kantona u 2008.godini može se zaključiti sljedeće:

1. Ostvareni rezultati na deminiranju u 2008.godini od 704.653,71m² odnosno u poslijeratnom periodu od 6.822.411,24m² u odnosu na 85.633.497,00m² sumljivih površina na području Tuzlanskog kantona ne odražavaju potrebe i interes Tuzlanskog kantona.

2. Potrebno je da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, Komisija za deminiranje i Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini u skladu sa donešenom Strategijom protivminskih akcija u Bosni i Hercegovini preduzmu aktivnosti koje će kroz

poslove generalnog i sistematskog izvidanja i deminiranja značajnije smanjiti sumnjive površine i opasnost po građanje Tuzlanskog Kantona.

3. Veličina sumljivih površina na području Tuzlanskog Kantona i dosadašnja dinamika deminiranja kao i broj nastradalih građana u miniskim poljima naglašavaju potrebu dodatnog angažiranja , a ne smanjenja aktivnosti deminerskih timova Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na području Tuzlanskog antona

4. Veličina sumljivih površina na području Tuzlanskog kantona traži od svih subjekata nadležnih za deminiranje dodatno angažiranje na ubrzanju procesa deminiranja i osiguranju potrebnih sredstava za tu namjenu.

D I R E K T O R

Zdenko Tadić
